

Progetto:	23P08	<b>CITTADELLA DELLA LOGISTICA</b> PDC CON CONTESTUALE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI CRESPINA LORENZANA (PI)	<b>Techbau</b> Engineering & Construction 
Rev.:	00		
Data:	2024/03/20		

# CITTADELLA DELLA LOGISTICA

PERMESSO DI COSTRUIRE CON CONTESTUALE VARIANTE  
AGLI STRUMENTI URBANISTICI ART.35 LRT 65/2014

---

## CRONOPROGRAMMA

---

## OPERE DI URBANIZZAZIONE

---

# 23P08DAR018RR-00

Professionista incaricato:

Ing. Luca Della Santina




*Luca Della Santina*

---

00	2024/03/20	Prima Revisione - First Release	N.Cognome	N.Cognome	N.Cognome
----	------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

REV.	DATA	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	APPROVATO APPROVED
------	------	----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

LAVORAZIONE		DURATA (gg)	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese
<b>OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADA URBANA (UMI1)</b>		<b>420</b>															
allestimento cantiere ed apprestamenti		7															
demolizioni marciapiedi, cordoni e scotico		28															
scavi a sezione marciapiedi		21															
preparazione piano posa rilevati		21															
formazione rilevato stradale		28															
conferimento materiali a discarica		21															
fondazione stradale		28															
scavi a sezione sottoservizi:																	
rete acquedotto		14															
rete telecom		14															
rete energia elettrica		14															
fognatura bianca		28															
posa in opera canalizzazioni e tubazioni sottoservizi:																	
rete acquedotto		14															
rete telecom		14															
rete energia elettrica		14															
fognatura bianca		28															
riempimenti scavi e posa pozzetti sottoservizi:																	
rete acquedotto		7															
rete telecom		7															
rete energia elettrica		7															
fognatura bianca		28															
conferimento materiali a discarica sottoservizi		14															
realizzazione cordoni e zanelle		42															
realizzazione pavimentazione marciapiedi		28															
strato di base		14															
strato di binder		14															
strato di usura		14															
pista ciclabile		28															
sistemazioni a verde rotonda e isole		28															
segnalética stradale		21															
illuminazione pubblica parcheggio auto		42															
illuminazione pubblica parcheggio autocarri		42															
illuminazione pubblica strada		42															
collaudi		28															
riplegamento cantiere		7															
<b>OPERE FUORI COMPARTO (via Lavoria e traversa)</b>		<b>56</b>															
allestimento cantiere ed apprestamenti		7															
fresatura pavimentazione		7															
strato di binder		14															
strato di usura		14															
segnalética stradale		7															
conferimento materiali a discarica		7															
riplegamento cantiere		7															
<b>OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADA EXTRAURBANA (UMI2)</b>		<b>357</b>															
allestimento cantiere ed apprestamenti		7															
scotico		28															
stabilizzazione a calce		35															
preparazione piano posa rilevati		21															
formazione rilevato stradale e posa tubazioni		35															
realizzazione ponte canale antifossetto		161															
conferimento materiali a discarica		14															
fondazione stradale		35															
strato di base		28															
strato di binder		28															
strato di usura		28															
sistemazioni a verde rotonda, isole e scarpate		42															
segnalética stradale		28															
illuminazione strada		42															
collaudi		28															

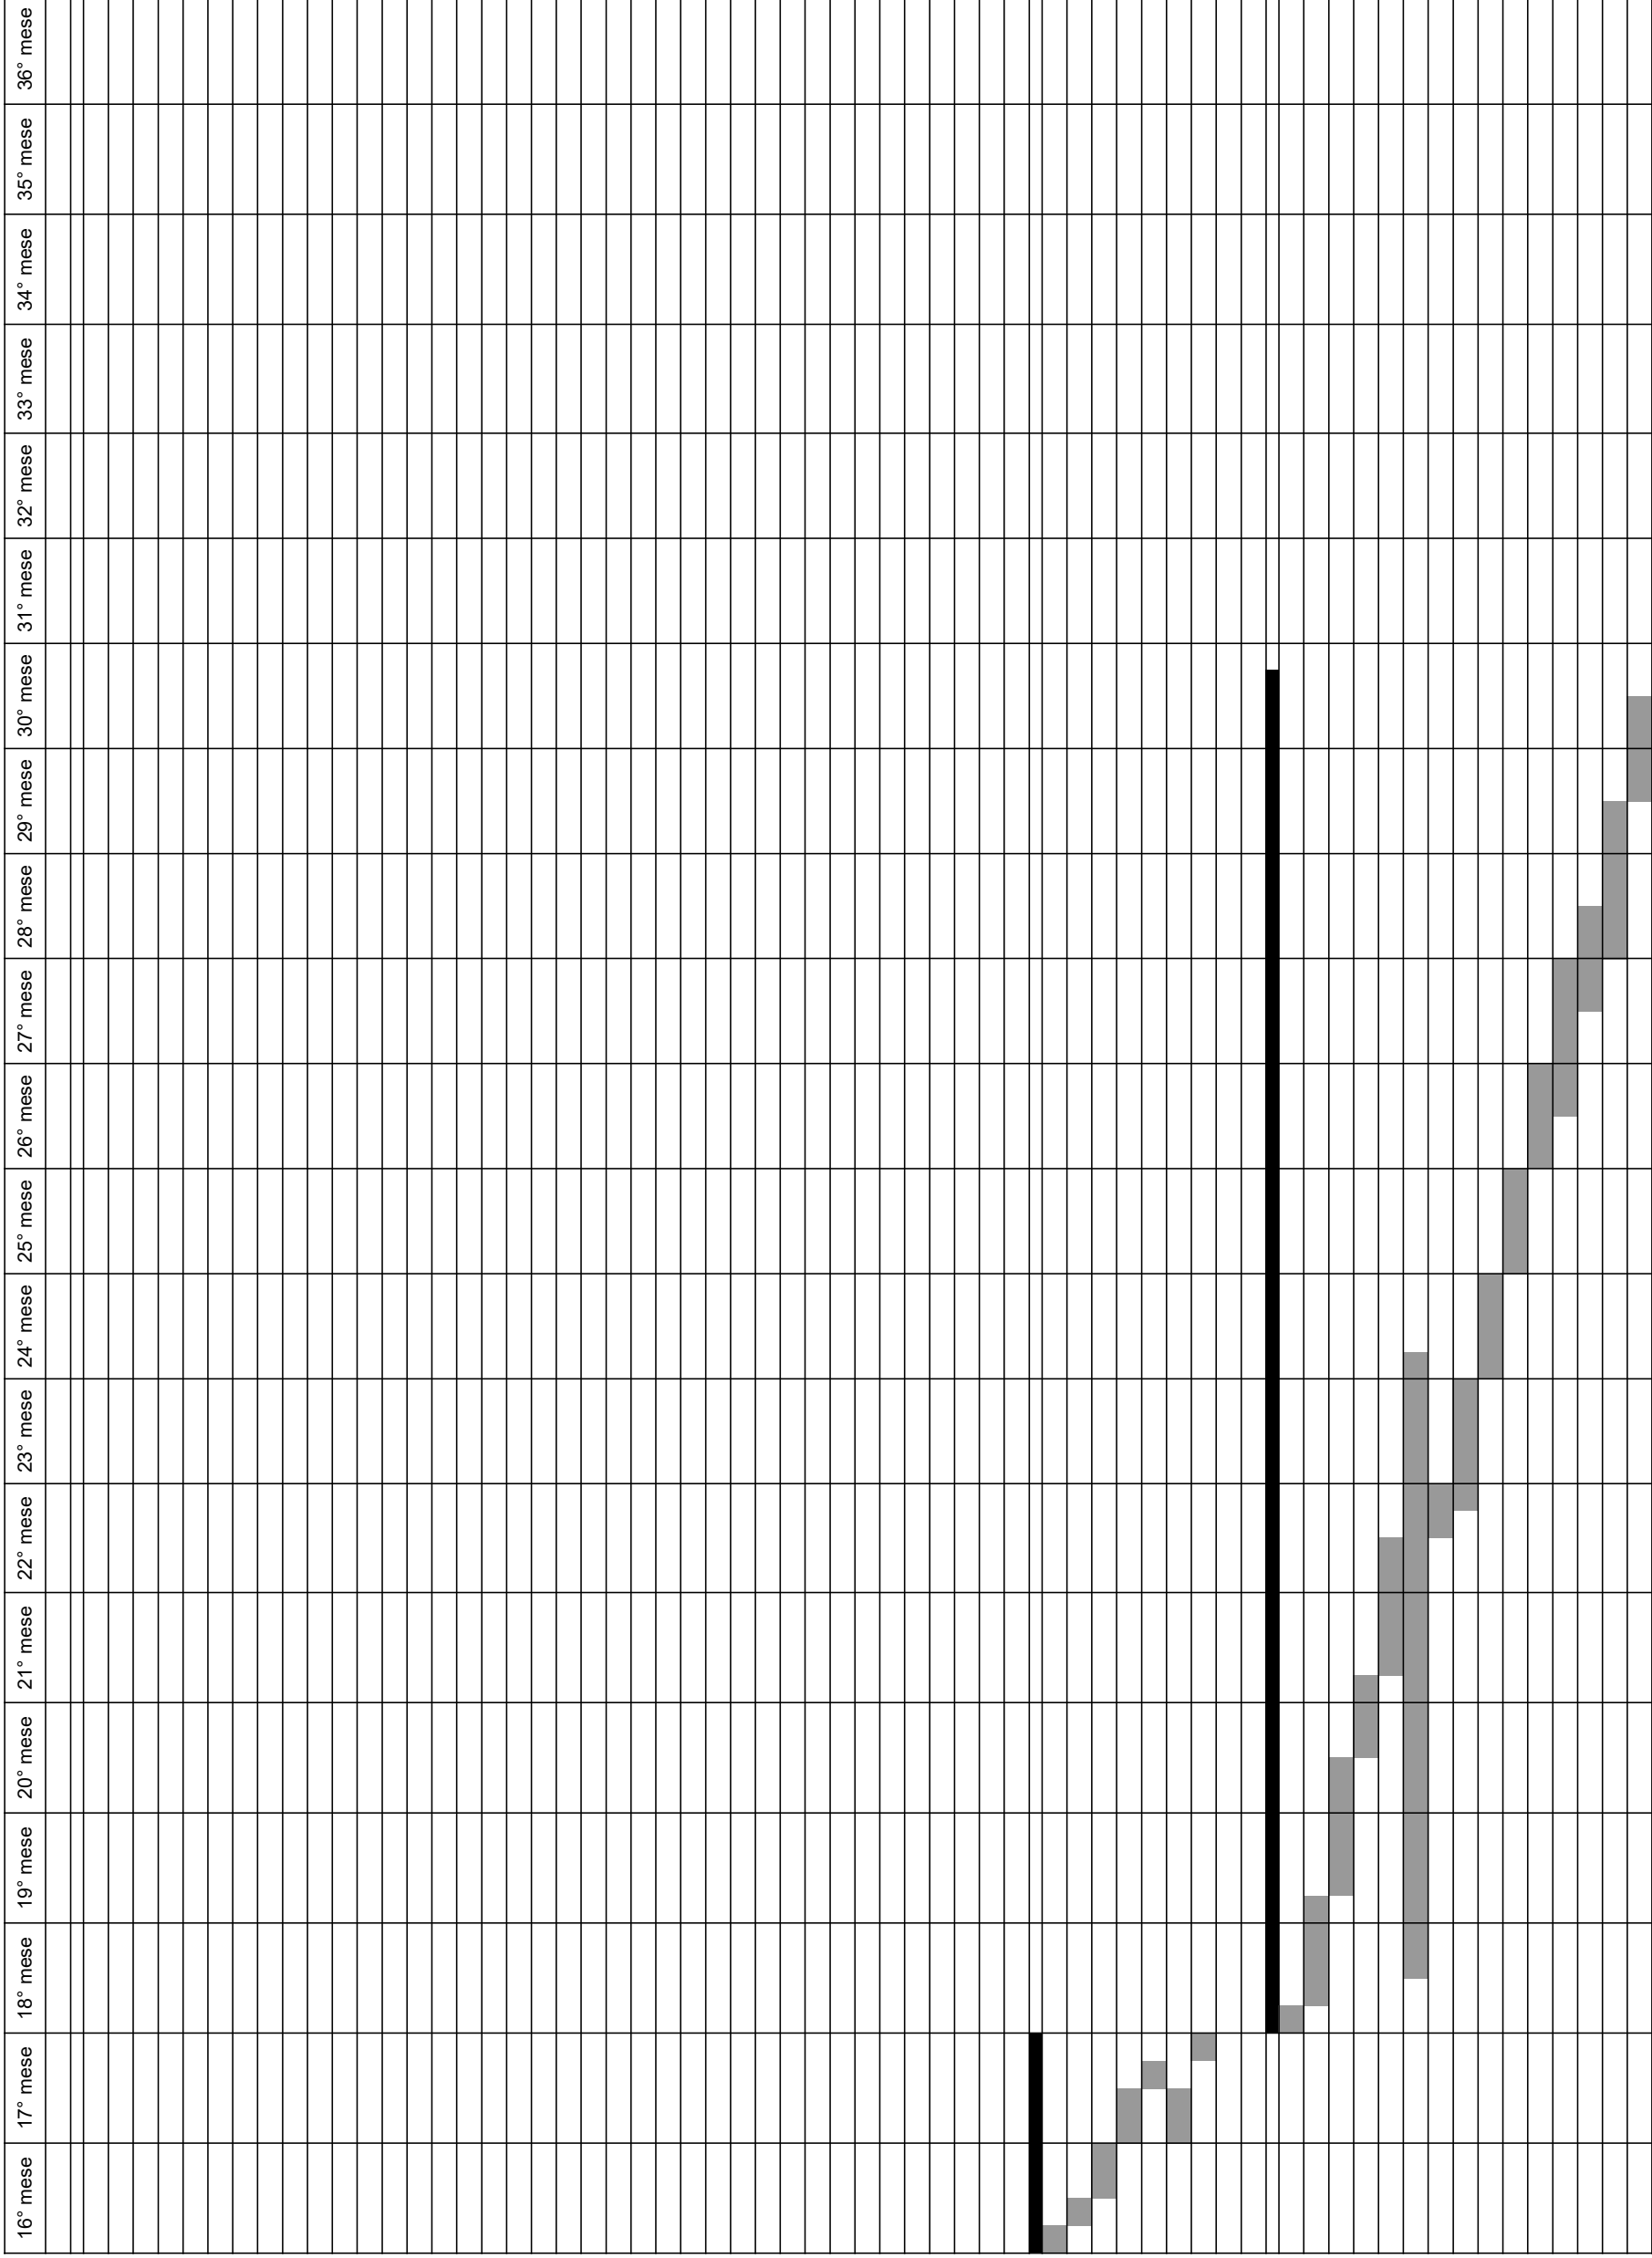

riplegamento cantiere	7																		
<b>OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA F.C. (rotatoria S.P. n°31)</b>	<b>343</b>																		
allestimento cantiere ed apprestamenti	7																		
scotico	21																		
demolizioni e fresature	28																		
stabilizzazione a calce	28																		
preparazione piano posa rilevati	14																		
formazione rilevato stradale	21																		
realizzazione strada bianca	21																		
conferimento materiali a discarica	7																		
fondazione stradale	21																		
strato di base	28																		
strato di binder	28																		
strato di usura	28																		
sistemazioni a verde rotatoria, isole e scarpate	28																		
segnalelica stradale	7																		
illuminazione strada	28																		
collaudi	28																		
riplegamento cantiere	7																		

